

233-7/2012  
Somlyó G.  
62/2017.

GINOP-7.1.5-16-2016-00002

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684  
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 303390  
Adószám: 15303392-2-41

másrésztől **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**  
Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**  
Azonosító szám (törzs-szám)  
Adószám: **15325770-2-19**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
**10048005-01711954-30005709**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Petróczi Imre**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.5-16-2016-00002** azonosító számon regisztrált, **2016.06.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.01.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete**

**István Emlékhely fejlesztése** című és **GINOP-7.1.5-16-2016-00002** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8360	Keszthely	hrsz		0401/2
	8360	Keszthely	hrsz		0374/11

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.11.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.09.28.**

##### 3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 50.000.000,- forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a

továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 949 816 536 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-ja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK  
IGAZGATÓSÁG

Kelt: *Gopph*, 2017. év *04* hónap *09* napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, *2017* APR 10. napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs terv

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002

Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogadtatékosság típusához igazodó sajtós igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	3 549 457	1	0	3 549 457
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra, vendéglátó egységek kialakítása, fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	241 759 213	1	0	241 759 213
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	343 617 841	1	0	343 617 841
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	4 000 000	1	0	4 000 000



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	3 000 000	1	0	3 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	3 900 000	1	0	3 900 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	90 000	1	0	90 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	596 000	1	0	596 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	790 000	1	0	790 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében körekedni kell a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való...	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	40 512 486	1	0	40 512 486





Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatói módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	30 000	30	0	900 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatói módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	12 000 000	1	0	12 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 500 000	1	0	8 500 000



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepció alapevő komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1 800 000	1	0	1 800 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység-nyomtatott kiadvány	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1	0	1 500 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 500 000	1	0	5 500 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 szerinti	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 906 000	1	0	1 906 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szeker	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 000 000	1	0	6 000 000



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, ki látok kialakítása, fejlesztése	Tartalék	Tartalék	10 720 000	1	0	10 720 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakciófejlesztést támogató projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	11 116 160	1	0	11 116 160
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	6 575 000	1	0	6 575 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	2 200 000	1	0	2 200 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	70 514 255	1	0	70 514 255
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 367 686	1	0	1 367 686



Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatói módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	152 652 438	1	0	152 652 438
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatói módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 300 000	1	0	1 300 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatói módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	450 000	1	0	450 000



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	7 000 000	1	0	7 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepció alapú komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kiállítás kialakítása, fejlesztése	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	6 000 000	1	0	6 000 000
<b>Elszámolható költségek:</b>							<b>949 816 536</b>

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt: 2017. év 04. hónap 03. napján.

Páfi Andrea  
osztályvezető

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, 2017. APR. 10. napján.

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYAEurópai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002


Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	949 816 536
Projekt elszámolható költsége	949 816 536
<b>Összesen:</b>	<b>949 816 536</b>



BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK  
IGAZGATÓSÁG

P.H.


Kelt *Gopal* 2017. év *04*..... hónap *03* napján.



Pálfi Andrea  
osztályvezető  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
PH.  
Kelt: Budapest, 2017. APR. 10..... napján.  
158.  
\*


## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002  
 Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	Projekt előkészítés	2016.09.30.	Tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett látogatói infrastruktúra jogerős építési engedélyre, és kiviteli tervdokumentációja a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll (és a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül), illetve a fejlesztéssel érintett helyszínek tulajdonviszonyai is rendezettek, ezért első mérföldkőként a látogatóközpont kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárását vesszük figyelembe.
2	Műszaki átadás-átvétel	2019.06.30.	A fejlesztéssel érintett látogatói infrastruktúra műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, beleértve a belső interaktív kiállítások átadás-átvételét, valamint az attrakció bejáráhatóságát és az élményszerű bemutatást szolgáló eszközök beszerzésére irányuló projektelemek teljesítése, továbbá a bevezető marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok teljeskörű elvégzése, a projekt fizikai zárása.

  
 BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Kelt: 2017. év 10. hónap 03. napján.



  
 Párfi Andrea  
 osztályvezető  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Kelt: Budapest, ..... napján.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok  
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002  
 Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2020.06.30.	21 840	21 840	21 840
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2021.06.30.	0	21 840	21 840
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2022.06.30.	0	21 840	21 840
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2023.06.30.	0	21 840	21 840
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2024.06.30.	0	21 840	21 840
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.06.13.	0				

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben.





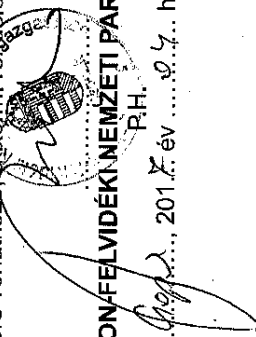
GINOP-7.1.5-16-2016-00002

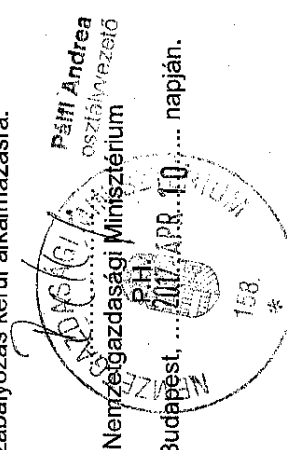
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. Rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.

**BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Kelt: 2017. évi május 10. napján.

  
P.H.

  
Páti Andrea  
osztályvezető  
Nemzeti Park Igazgatóság  
Kelt: Budapest, 2017. APR. 10. napján.

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002  
 Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Projekt teljes körű előkészítettsége	Projekt teljes körű előkészítettsége, amely magában foglalja a fejlesztéssel érintett látogatói infrastruktúra jogerős építési engedélyének, és kivitelezési tervdokumentációjának, kiállítási koncepciójának rendelkezésre állását, a fejlesztéssel érintett helyszín tulajdonviszonyainak rendezettségét, illetve a projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásainak megjelentetését.	Jogerős építési engedély, kivitelezési tervdokumentáció, kiállítási koncepció és a közbeszerzési eljárások dokumentációjának rendelkezésre állása.
2	Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése	<p>Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása, amely magában foglalja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o a turistafogadás feltételeinek létrehozását vendégfogadó, információs terek kialakításával;</li> <li>o az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interaktív kiállítás létrehozását;</li> <li>o mozi-terem kialakítását, többfunkciós előadó terem és foglalkoztató helyiség, bolti helyiség és étterem kialakítását;</li> <li>o a látogatóközpont komplex akadálymentesítését;</li> <li>o tanösvény, valamint madár voltterek kialakítását a látogatóközpont udvarán, továbbá vízi tanösvény kialakítását az épület mellett húzódó Egyesített-övcsatorna (Gyöngyös-patak) mentén;</li> <li>o az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése részeként zöldfelületek kialakítását, parkolók létesítését, a látogatóközpont előtti út burkolatjavítását 300 méteren, információs táblák elhelyezését;</li> <li>o környezetbarát, megújuló energiát hasznosító épületenergetikai rendszer kialakítását;</li> <li>o a kenek számára kialakított szállóhely létesítését;</li> <li>o család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását a látogatóközponthoz kapcsolódóan.</li> </ul> <p>A Diás-szigeti Fekete István Emlékhely vonzerőfejlesztése, amely magában foglalja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o az épület felújítását és átalakítását, projektarányos akadálymentesítését;</li> </ul>	<p>A Kis-Balaton Látogatóközpont teljes alapterülete 2 884,2 m<sup>2</sup>, amelyből 1978,2 m<sup>2</sup> az épület előtti, illetve mögötti található burkolat teraszok területe, azaz a látogatóközpont belső tereinek alapterülete kb. 900 m<sup>2</sup>.</p> <p>A talpa illeszkedő modern épület építészeti formavilágának kialakításánál az autópályák főit átívelő, ún. vadhidak szolgáltak mintául. A látogatóközpont tetőszerkezete egy nagy híd, amely járható zöldtetős kialakítású. A szerkezete határozott, szikár vasbeton, alatta a részben transzparens beépítés könnyedebb fa és üveg szerkezetekkel kerül kialakításra.</p> <p>Az előcsarnok hosszú tere egy fontos elosztótér, innen a multifunkcionális foglalkoztató és előadóterem, a vizesblokkok, az étterem fogasztótere valamint a kiállítóter nyílik. Az északi traktusban az irodák és a kiszolgáló terek kaptak helyet. Az előcsarnokból lehet a belső kertre kilépni, ahol játszótér, pihenőkert, továbbá a tanösvény induló-gyűlekezőhelye található.</p>



Mértődkő sorszama	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
		<p>o az élményszerű látogatás és a turistafogadás feltételeinek fejlesztését a meglévő kiállítók egybenyitásával, illetve új interaktív kiállítás kialakításával;</p> <p>o a Matula kunyhó felújítását hagyományos technológiával.</p> <p>Az attrakciók bemutathatóságát közvetlenül szolgáló közlekedési eszközök beszerzése: elektromos gépjárművek (2 db NRG S14 típusú, 14 férőhelyes és 1 db NRG S8 típusú, 8 személyes golfautó); kenuk (9 db Aluminium-Inkas 525 típusú kenu);</p> <p>Az élményszerű bemutatást szolgáló eszközök beszerzése: 30 db Long Peirng 9X30 típusú monokulár; 1 db Minox MD 80Z típusú spektív állvánnyal;</p> <p>Kapcsolódó marketing tevékenység (bevezető marketing tevékenység megvalósítása).</p>	<p><b>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága</b></p> <p>A Kis-Balaton Látogatóközpont közvellen környezetének fejlesztése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o parkoló létesítése és kerékpártárolók elhelyezése: az épület mellett 37 férőhelyes gépjárműparkoló kerül kialakításra, amelyek közül kettő akadálymentes kialakítású, egy további pedig szélesített, családok parkolóhelyként kerül kialakításra, továbbá 14 darab kerékpártároló kerül elhelyezésre;</li> <li>o külső bemutatótér: a látogatóközpont keleti homlokzata terasszal kapcsolódik a ligetes parkhoz. Az épülettel távolabb, a liget közelében helyezhető el a nedves és a száraz volier, bennük bagoly-, és réce fajok egyedével. A park teljes területe, a liget, a volierek környezete egyben külső bemutató térként funkcionál;</li> <li>o játszótér: a liget előterében, a külső teraszról lefüzve kap helyet a játszótér, amelynek minősített játszóeszközei között mérleghinta, hinták, homokozók, patogókorongok, egyszemélyes rugós játékok, egy mászóvár, valamint egy kötélpálya is megtalálható;</li> <li>o tanösvény: a látogatóközpont belső udvarán egy tanösvény kialakítása is tervezett, amelynek állomásainál beszélő (napelemes) tanösvény táblák elhelyezésére, illetve egyszerűbb interaktív elemek (pl. hasábforgatók, tili-tollik, elforgatható elemek) telepítésére kerül sor;</li> <li>o pihenőtér: a látogatóközpont külső teraszán asztalok-székek várják a látogatókat, a park teljes területe, nagy kiterjedésű gyepfelületei és az árnyékos liget a „füre letelepedő ökoturizmusnak” ad helyet;</li> <li>o fenntartási terület: a park fenntartását szolgáló telephely a kialakításra kerülő 9 db komposztálóval a kutatóház kiszolgáló épülete mellett kap helyet;</li> <li>o napelem park: napcellákból álló háztartási méretű kísérőmű kialakítása a játszótér mögötti területen;</li> <li>o kenuk beszállóhely: a látogatóközpont mellett húzóó Egyesített-övcstartornán (Gyöngyös patak) egy vízi tanösvény kialakítása tervezett, amely szakvezetett kenuk túrák keretében látogatható.</li> </ul>



Mérőföldő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
			<p>A projekt másodlagos fejlesztési helyszíne a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely épülete. Az épület jelenleg nyolc kisebb kb. 8-10 m<sup>2</sup>-es helyiségből áll, amelyek közül négy helyiségben működik kiállítás. Az épület helyiségeinek elrendezése nem felel meg a látogatómenedzsment követelményeinek, ezért az épület átalakítása tervezett, amelynek részeként a válaszfalak elbontásával egy egybefüggő, 82,94 m<sup>2</sup>-es kiállítóteret jön létre. Az átalakítási munkák mellett a felújítási munkák magukban foglalják a padlóburkolat cseréjét, a nád tetőfedés felújítását, a nyílászárók felújítását, a vakolatok javítását, valamint a projektarányos akadálymentesítést. Az egybenyitott kiállítóterben természeti diorámákra, illetve interaktív múzeumpedagógiai installációkra építő kiállítás kialakítása tervezett. Mindemellett az épület mellett található Mátula kunyhó felújítása is tervezett helyi anyagok és szerkezetek felhasználásával, hagyományos technológia alkalmazásával. Az épületet érintő felújítási és átalakítási munkák nem minősülnek építési engedélyköteles tevékenységnek.</p>




BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

P.H.


Kelt: Sopron, 2017. év ... 05. ... hónap 03. napján.

Pálli Andrea  
osztályvezető

Nemzeti Gazdasági Minisztérium



Kelt: Budapest, 2017. APR 10. .... napján.

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

  
Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
